



PROVINCIA DI RAVENNA

SETTORE LAVORI PUBBLICI



OGGETTO: "interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete viaria di interesse regionale - annualita' 2017-2018 -" CUP: J77H18000320002 - Lotto funzionale 2 - AMBITO TERRITORIALE di FAENZA - CIG 763125787D

COMMITTENTE: Provincia di Ravenna.

CONTRATTO: Rep. 13318 del 09/08/2019 registrato a Ravenna il 09/08/2019 al n. 7581 serie 1T

IMPRESA AGGIUDICATARIA : COSTRUZIONI L. AMENDOLA s.r.l. con

Sede a Aquara (SA) – CAP 84020 - VIA J.F.Kennedy n. 5 - P.IVA. 03059970651 -

L'IMPRESA

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico
[Signature]

Importo a base d'asta	€.	165.000,00
Deduzione del ribasso d'asta del 13,32 %	€.	21.978,00
Restano netti i lavori principali	€.	143.022,00
Costi degli apprestamenti di sicurezza ed igiene (ai sensi del D.Lgs. 81/2008)	€.	1.500,00
<u>Importo totale di contratto</u>	€.	<u>144.522,00</u>

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: n. 1173 del 15/10/2018, divenuta efficace con nota PG. 10244 del 17/04/2019.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

LOTTO FUNZIONALE 2 - AMBITO TERRITORIALE FAENZA

PROGETTO PRINCIPALE: il progetto definitivo ed esecutivo, relativo ai lavori in oggetto, è stato redatto dal Settore Lavori Pubblici - Viabilità della Provincia di Ravenna ed è stato approvato con Atto del Presidente n° 102 del 30/07/2018 con

L'DIRETTORE DEI LAVORI
[Signature]

importo complessivo di **€. 690.473,02** ripartito in tre lotti funzionali, come di seguito

rappresentato:

QUADRO ECONOMICO (art 16 del DPR n.207/2010)		Euro
LOTTO 1 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V. RAVENNA)		
a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1 LAVORAZIONI A MISURA		165.000,00
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
b1 ONERI A CORPO		1'500,00
TOTALE IMPORTO a1)+b1) LOTTO 1 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V. RAVENNA)		166.500,00
LOTTO 2 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V. FAENZA)		
a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1 LAVORAZIONI A MISURA		165.000,00
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
b1 ONERI A CORPO		1'500,00
TOTALE IMPORTO a1)+b1) LOTTO 1 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V.FAENZA)		166.500,00
LOTTO 3 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V. LUGO)		
a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
a1 LAVORAZIONI A MISURA		165.000,00
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
b1 ONERI A CORPO		1'500,00
TOTALE IMPORTO a1)+b1) LOTTO 1 (AREA TERRITORIALE U.O.M.V.LUGO)		166.500,00
a) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
b) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
TOTALE IMPORTI a) + b)		499.500,00
c) SOMME A DIPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: Lavori in economia di completamento e finitura IVA compresa per:		
c1 Trattamenti superficiali, manutenzione e ripristini opere d'arte, segnaletica orizzontale e verticale, barriere di sicurezza, ecc...		55.500,00
c2 Rilievi accertamenti ed indagini		-
c3 Allacciamenti a pubblici servizi		
c4 Imprevisti		2.368,02
c5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		-

L'IMPRESA

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico
Amendola

IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Firma]

c6	Accantonamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016	-
c7	Spese di cui all'articolo 24 del D.Lgs.n.50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, spese relative al fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs n.50/2016, e precisamente:	
	- Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs.n.50/2016	-
	- Spese tecniche per l'affidamento di incarichi professionali esterni quali coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva;	7.000,00
	Fondo per incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso:	
	- 80% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs n.50/2016;	7.992,00
	- 20% del fondo per incentivi per funzioni tecniche da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4 del D.Lgs n.50/2016;	1.998,00
c8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	-
c9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-
c10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	-
c11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici e precisamente:	
	- accertamenti tecnici, prove di laboratorio, oneri a carico committente per prove di carico in fase di collaudo	6.000,00
	- incarico esterno per collaudo statico in corso d'opera	-
c12	IIVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e precisamente:	
	- IVA, (IVA al 22% su a+b)	109.890,00
	- Contributo autorità per la vigilanza dei lavori - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.	225,00
TOTALE c)		190.973,02
IMPORTO TOTALE		690.473,02

L'IMPRESA

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

FINANZIAMENTO DELLA SPESA: l'intervento predetto viene finanziato con i fondi al capitolo di spesa 21801/10 del bilancio 2018 come segue :

- Quanto a euro 426.680,75 con avanzo di Amministrazione vincolato da trasferimenti (concessi a questa Provincia con deliberazione della Giunta Regionale n. 764 del 05/06/2017 "L.R. 3/1999 e s.m. e i. - Attribuzione risorse finanziarie alle province di Forlì-Cesena , Ravenna , Rimini per

interventi di manutenzione straordinaria sulla Rete stradale Provinciale – anno 2017”);

- Quanto a euro 263.792,27 con contrinuti della Regione Emilia-Romagna concessi con la delibera della Giunta Regionale n. 1443 del 06/02/2018 “L.R. 3/1999 e s.m. e i. Attribuzione risorse finanziarie alle province per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale Provinciale – Anno 2018 “ (capitolo di entrata 41810 Trasferimento fondi per costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria rete stradale” del bilancio 2018;

L'IMPRESA

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico
[Firma]

DESCRIZIONE DEI LAVORI: i lavori di cui alla presente relazione prevedevano il risanamento di tratti degradati di pavimentazione superficiale stradale, previa fresatura a freddo, mediante il rifacimento dello strato d'usura in conglomerato bituminoso chiuso a caldo con bitumi tradizionali e inerte calcareo..

ASSUNZIONE DEI LAVORI: ai sensi dell'art. 36, comma 2° lett.c Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., veniva esperita una procedura negoziata esperita in data 10 ottobre 2018 presso gli Uffici Provinciali per l'aggiudicazione dei lavori di ***"interventi di manutenzione straordinaria DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELLA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA – D.M. 49/2018 – annualità 2019 - " CUP: J67H18001340001 – - Lotto 2 - Ambito territoriale di Faenza CIG 7975125159 -"*** con Provvedimento Dirigenziale n. 1173 del 15/10/2018, divenuta efficace con nota **Pg. n. 10244 del 17/04/2019** rimase aggiudicataria definitiva l'impresa **COSTRUZIONI L. AMENDOLA s.r.l. con Sede a Aquara (SA) – CAP 84020 - VIA J.F.Kennedy n. 5 - P.IVA. 03059970651 -** offrendo il ribasso del **13,32 %** sull'importo a base d'asta di € 165.000,00 e così per un corrispettivo di nette € 143.022,00 oltre a € 1.500,00 per gli oneri relativi agli

[Firma]
IL DIRETTORE DEI LAVORI




apprestamenti di sicurezza, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n.81/08, per un importo totale di € 144.522,00 =

CONTRATTO: il contratto è stato stipulato in data **09/08/2019** al n. di repertorio **13318** registrato a Ravenna il 09/08/2019 al n. 7581 serie 1T.

IMPORTO CONTRATTUALE: l'importo contrattuale in base all'applicazione del complessivo ribasso d'asta del **13,32 %** sulla somma di € 165.000,00 è risultato di nette € 143.022,00 oltre a € 1.500, relativi agli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e così per un totale di €. **144.522,00 =**

VERBALI NUOVI PREZZI: durante il corso dei lavori non furono convenuti nuovi prezzi.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE: oltre al progetto principale non furono redatte perizie di variante.

ATTI AGGIUNTIVI / SOTTOMISSIONE: non furono rilasciati dall'Impresa atti di sottomissione.

CAUZIONE: come risulta dall'art.16 del contratto n. **13318** di repertorio del 09/08/2019 l'Impresa ha costituito la cauzione definitiva mediante fidejussione assicurativa n. 109212422 emessa in data 26/04/2019 dalla GROUPAMA Assicurazioni s.p.a. Agenzia di Battipaglia (SA) dell'importo di € 9.626,00 (diconsi euro novemilaseicentoventisei/00), importo ridotto del 50% rispetto a quanto previsto, in quanto l'impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 n. 223809 rilasciata in data 30/11/2004 dalla Bureau Veritas Italia s.p.a. di Milano.

SOMMA AUTORIZZATA: in definitiva la somma autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta:

L'IMPRESA

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico
Amendola

IL DIRETTORE DEI LAVORI



a) per lavori al netto del ribasso d'asta:	€ <u>143.022,00</u>
b) per oneri di sicurezza:	€ <u>1.500,00</u>
TOTALE	€ <u>144.522,00</u>

POLIZZE ASSICURATIVE: l'Impresa, a copertura dei danni di esecuzione e per la responsabilità civile ha stipulato la seguente polizza assicurativa C.A.R. n. 109212831 emessa dalla GROUPAMA Assicurazioni s.p.a. - Agenzia di Battipaglia (SA) - in data 26/04/2019 .

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori riferiti al presente contratto furono consegnati, in 2° convocazione, con verbale redatto in data 30/09/2019.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE: per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto giorni **30** naturali consecutivi a decorrere dalla data riferita alla 1° convocazione di consegna (20/09/2019) così come riportato nel verbale di consegna del 30/09/2019 che stabiliva che il termine utile doveva scadere quindi il giorno **19/10/2019**. Si rimanda in proposito a quanto riportato nel paragrafo *DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO – CONDOTTA DEI LAVORI..*

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo *DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO – CONDOTTA DEI LAVORI* .

PROROGHE CONCESSE: durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe. Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo *DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO – CONDOTTA DEI LAVORI*.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: l'ultimazione dei suddetti lavori è avvenuta il giorno **21/09/2020** come fu accertato con VERBALIZZAZIONE redatta in data 07/08/2020 . Si rimanda sui tempi dell'intervento al paragrafo *DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO – CONDOTTA DEI LAVORI*.

L'IMPRESA

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico
[Firma]

[Firma]
IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Stampato: VERBALE]

PENALI PER IL RITARDO: Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo *DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO – CONDOTTA DEI LAVORI ED A QUANTO RIPORTATO NEL PARAGRAFO DEDICATO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI.*

DANNI DI FORZA MAGGIORE: durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO – CONDOTTA DEI LAVORI : durante il corso dei lavori, a partire dal verbale di consegna lavori (in 2° convocazione) datato 30/09/2019, questa Direzione Lavori è dovuta intervenire con n. **3 ordini di servizio** in quanto l'Impresa suddetta, nonostante gli appelli, non procedeva a dare inizio ai suddetti lavori. Tali negligenze ed inottemperanze così come riscontrato e riportato negli ordini di servizio n. **1 del Pg. 23881 del 7/10/2019, n. 2 Pg. 26159 del 4/11/2019, n. 3 Pg. 27099 del 13/11/2019** hanno portato all'inoltro di convocazione di codesta Impresa ai fini della sottoscrizione del verbale ai sensi dell'art. 108 comma 4 – 2° periodo - del D.L.gs 50/2016, propedeutico alla rescissione contrattuale. In tale sede (vedasi verbale del 7/02/2020) l'Impresa suddetta manifestava l'intenzione di rendersi disponibile a riparare alle succitate inottemperanze offrendo disponibilità ad eseguire i lavori previsti in contratto. Successivamente in data 24/03/2020 veniva recapitata una nota datata 23/03/2020 (Pg. Provincia n. 8626) da parte di codesta Impresa con la quale veniva confermata la disponibilità ad eseguire i lavori di cui al contratto succitato.

Con nota Pg. n. 14888 del 15/06/2020 integrata con Pg. n. 15357 del 19/06/2020 veniva dato riscontro alla nota dell'Impresa del 23/03/2020 (Pg. n. 8626 del 24/03/2020) stabilendo determinate condizioni al fine di poter accogliere la disponibilità offerta (considerando le esigenze di tutela del patrimonio stradale

L'IMPRESA

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico
Amendola

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Provinciale) con un crono-programma definito da rispettare pena la procedura rescissoria di cui sopra. Successivamente nei tempi imposti veniva inoltrata da parte dell'Impresa COSTRUZIONI L. AMENDOLA srl di Aquara (SA) apposita nota (Pg.n. **15834 del 24/06/2020**) di accettazione delle condizioni sopra richiamate. Nella medesima nota veniva avanzata la proposta di offrire "maggiori lavori" rispetto a quanto previsto dal contratto succitato a compensazione delle penalità maturate causa il ritardo sui lavori arrecato.

In seguito venivano "iniziati" i lavori in data **24/08/2020** (vedasi verbalizzazione del 24/08/2020) per poi essere **definitivamente completati** in data **21/09/2020** (vedasi verbalizzazione del giorno 21/09/2020). Nel corso di tale periodo veniva recapitata, da parte della predetta Impresa una nota Pg.n. 21488 dell'1/09/2020 a cui questa Provincia ha fornito puntuale riscontro con nota Pg n. 22147 dell'8/09/2020. Con la nota suddetta veniva fissato il termine "inderogabile" per dare finite tutte le lavorazioni **al giorno 21/09/2020**.


LAVORI IN ECONOMIA: in corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.

ANTICIPAZIONI IN DENARO: in corso di esecuzione non furono effettuate dall'imprenditore delle anticipazioni in denaro.

SUBAPPALTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto non furono autorizzati subappalti.

SUBAFFIDAMENTI: nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto non sono stati concessi subaffidamenti =

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori, fatto salvo quanto riportato al paragrafo "DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO – CONDOTTA DEI LAVORI", nella loro

L'IMPRESA
COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico


IL DIRETTORE DEI LAVORI



fase esecutiva, di cui sopra, si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: si segnalano solamente variazioni, contenute entro i limiti in facoltà della D.L. e che riguardano modifiche nelle quantità previste nei singoli tratti di strada o sui tratti di strada da trattare a seconda delle necessità riscontrate all'atto dei lavori .

CERTIFICATI DI ACCONTO: durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di acconto per un importo totale di €. **136.185,43.**

- 1° certificato di pagamento del 05/10/2020 pari ad € 136.185,43

STATO FINALE: lo stato finale è stato redatto in data **25/01/2021** ed importa complessivamente netti € **144.132,19** così distinti:

a) per lavori a misura e somministrazione nette	€ 142.632,19
b) anticipazioni	€ —
c) oneri per la sicurezza	€ 1.500,00
Sommano complessivamente per lavori	€ 144.132,19


Da cui sono dedotti gli acconti corrisposti con:

- 1° certificato di pagamento del 05/10/2020 pari ad	€ 136.185,43
Sommano gli acconti corrisposti	€ 136.185,43

Secondo il detto **stato finale** resta quindi il credito

netto dell'Impresa in **€ 7.946,76**

Il suddetto **Stato Finale dei lavori** riporta altresì il conteggio dei "*maggiori lavori*" eseguiti dall'Impresa suddetta a compensazione delle penalità derivanti dal ritardo accumulato nella 1° fase dei lavori (vedasi quanto riportato nel paragrafo "*DISPOSIZIONI ED ORDINI DI SERVIZIO – CONDOTTA DEI LAVORI*").



L'IMPRESA

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA: per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, è stato affidato apposito incarico professionale per i lavori in parola all'Ing. Andrea Galassi di Cervia (RA).

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO: durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa esecutrice ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di SALERNO con codice Ditta 04794825/38 - PAT 91876018/24.

ASSICURAZIONI SOCIALI: il responsabile del procedimento ha provveduto all'accertamento per via telematica del DURC relativo all'Appaltatore suddetto alle scadenze previste nel regolamento. Risultando il suddetto DURC positivo si considera acquisita la regolarità contributiva dell'Appaltatore (DURC con esito regolare per liquidazione).

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA': il sottoscritto Direttore dei Lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI: In sostituzione gli avvisi prescritti dall'art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il sottoscritto Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretti o indiretti né occupate proprietà di terzi.

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL'IMPRESA: per i lavori in questione l'Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.

L'IMPRESA
COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico
Amendola

IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Firma]
[Stampato]

DIREZIONE LAVORI: i suddetti lavori “**interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete viaria di interesse regionale - annualità 2017-2018** –“ CUP: **J77H18000320002 - Lotto funzionale 2 - AMBITO TERRITORIALE di FAENZA - CIG 763125787D** sono stati seguiti in qualità di Direttore dei Lavori / Direttore Operativo dal Geom. Roberto Lasi. Altri componenti dell'ufficio di Direzione Lavori sono stati: Sig. Patuelli Franco e Sig. Zoli Andrea in qualità di ispettori di cantiere

L'IMPRESA

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico
Amendola L.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Dalle verifiche effettuate in loco nei tratti stradali riguardanti i suddetti lavori, in data 05/03/2021, dalla Direzione dei Lavori, Geom. Roberto Lasi e P.a. Patuelli Franco, (tenuto conto delle restrizioni legate all'epidemia da COVID-19 che ha reso difficoltosa la presenza di personale dell'Impresa suddetta) si è preso atto degli interventi di ripristino già effettuati, a carico della predetta Impresa, lungo la S.P.n. 20 “Rugata-Madrara” ed in corrispondenza di n. 1 giunzione lungo la S.P.n. 16 “Marzeno”, si desume quanto segue :

con la scorta del progetto e degli atti contabili visionati in merito ai lavori effettivamente eseguiti, risulta che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli risultanti dalla contabilità e rientranti nelle previsioni di progetto.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- ✓ che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto, salvo le lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione Lavori ed a quanto impartito in corso d'opera ;
- ✓ che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti alle caratteristiche richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto (considerando l'esito della prova di laboratorio eseguita Rapporto Prova n.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
[Firma]
[Stampato]

374647 Istituto Giordano di Bellaria RN -) e secondo le disposizioni impartite dal
Direttore dei Lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- ✓ che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- ✓ che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati ;
- ✓ che i lavori sono stati ultimati in tempo utile e che, comunque, sono state compensate (mediante esecuzione di maggiori lavori di pari importo) le penalità relative ai ritardi accumulati nella 1° fase di lavoro (vedasi STATO FINALE DEI LAVORI) ;
- ✓ che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che il DURC risulta REGOLARE ;
- ✓ che per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare, né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- ✓ che l'impresa Appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve ;


CERTIFICA

che i lavori di **“interventi di manutenzione straordinaria lungo la rete viaria di interesse regionale - annualità 2017-2018 –“** CUP: J77H18000320002 - Lotto funzionale 2 - **AMBITO TERRITORIALE di FAENZA - CIG 763125787D”** sopra descritti aggiudicati all'Impresa **COSTRUZIONI L. AMENDOLA s.r.l.** con Sede a **Aquara (SA) – CAP 84020 - VIA J.F.Kennedy n. 5 - P.IVA. 03059970651** - in base al contratto stipulato in data **09/08/2019** al n. **13318** di repertorio, esecutivo ai sensi di legge e registrato a Ravenna Serie 1T con il n. 7581 del 09/08/2019, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

ammontare del conto finale


€ 144.132,19

L'IMPRESA

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico


IL DIRETTORE DEI LAVORI



a dedursi:

- 1° certificato di pagamento del 05/10/2020 pari ad € 136.185,43

resta il credito dell'Impresa di €. **7.946,76**

(diconsi euro SETTEMILANOVECENTOQUARANTASEI/76) per i quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.

Il presente certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo **decorsi due anni dalla data della sua emissione**; nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Faenza, li 22/03/2021

L'IMPRESA
(COSTRUZIONI L. AMENDOLA srl)

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico
[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Roberto Lasi)

[Signature]
[Circular Stamp]

Visto, accertato e confermato:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Chiara Bentini)

fg. 7643 19/03/2024

COPIA



DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto LUCIDO AMENDOLA, nato ad AQUARA (SA) il 24/08/1960, residente in AQUARA (SA), via F. SPIRITO n. 46, CAP 84020, in qualità di Rappresentante Legale della società COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.R.L. con sede legale in AQUARA (SA), via F. SPIRITO n. 46, Partita IVA n. 03059970651, relativamente ai lavori di "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LA RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE – ANNUALITA' 2017-2018" – LOTTO FUNZIONALE 2 – AMBITO TERRITORIALE DI FAENZA – CUP J77H18000320002 – CIG 763125787D, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

che, come da Vs. nota del 18 Marzo 2021, con cui veniva trasmesso alla scrivente impresa il "Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori", gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti mediante acquisto di n. 5 marche da bollo, trasmesse in allegato, da € 16,00 con i seguenti identificativi:

- 01170167956169 del 18/03/2021
- 01170167956135 del 18/03/2021
- 01170167956146 del 18/03/2021
- 01170167956157 del 18/03/2021
- 01170167956170 del 18/03/2021

AQUARA (SA), lì 18/03/2021

In fede
Costruzioni L. Amendola S.r.l.

COSTRUZIONI L. AMENDOLA S.r.l.
L'Amministratore Unico

Costruzioni L. Amendola S.r.l.

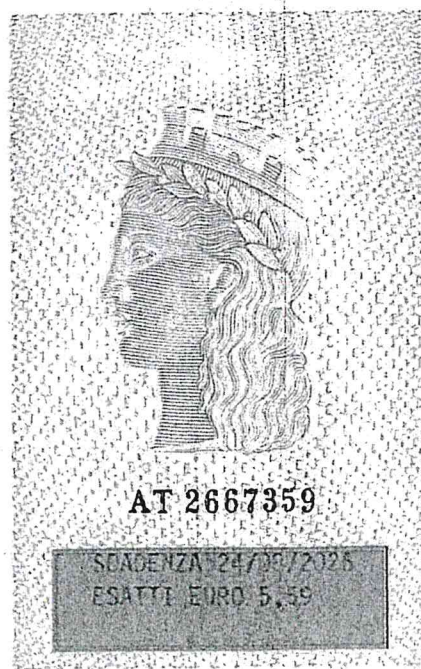
Sede legale
84020 - AQUARA(SA)
Via F. Spirito, 46
Tel/fax 0828/1962567
costruzioniamendola@gmail.com

Capitale sociale € 100.000,00
R.E.A. CCIAA Salerno n. 256927
P.IVA 03059970651
costruzioni.amendola@pec.it



Cognome **AMENDOLA**
 Nome **LUCIDO**
 nato il **24 AGOSTO 1960**
 (atto n. **33** p. **I** s. **A**)
 a **AQUARA** (**SA**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **AQUARA (SA)**
 Via **FRANCESCO SPIRITO, n. 46**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **IMPRENDITORE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **mt. 1,75**
 Capelli **neri**
 Occhi **castani**
 Segni particolari **=====**


 Firma del titolare *Amendola Lucido*
 Aquara il **10/11/2015**
 IL SINDACO
 Il Sindaco
 Impronta del dito indice sinistro
Francesco Brenca

IPZS s.p.a. - OFFICINA C.V. - ROMA

